



alperia

Projektidee Pumpspeicherwerk St. Walburg 2

Arbeitsgruppe „für-ulten“
St. Walburg, am 27. November 2025

*energie
neu gedacht*

Agenda




1. Update Projektfortschritt
2. Update Zoggler Staudamm
3. Update Altlasten

alperia

1) Update Projektfortschritt

***energie
neu gedacht***

Aktueller Stand und Ausblick

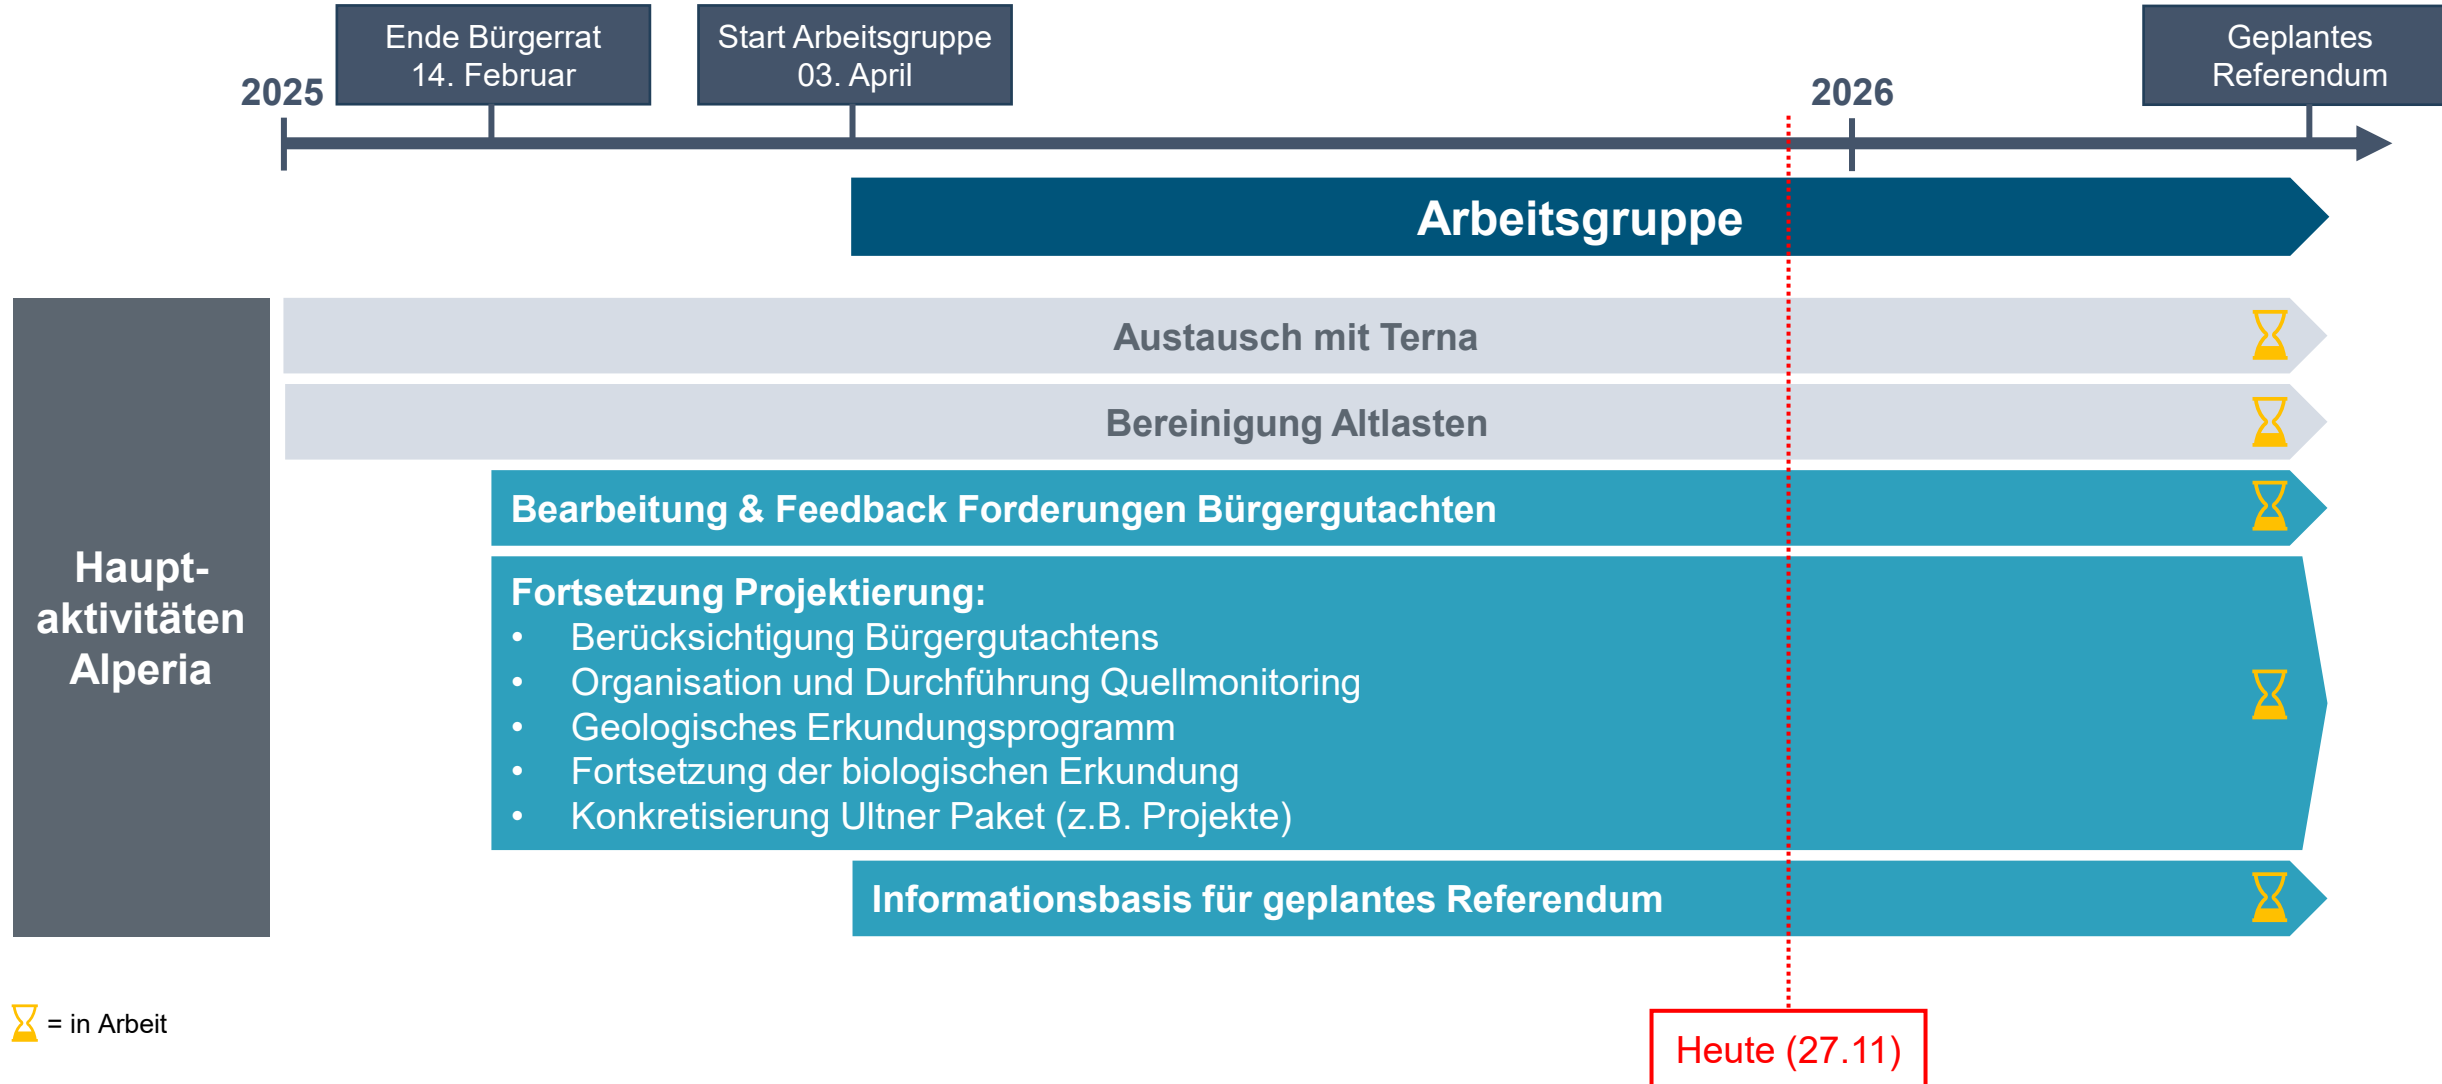

PSKW St. Walburg 2: Aktueller Stand und Ausblick



Thema	Aktueller Stand	Nächste Schritte	Status
Leitung Terna	<ul style="list-style-type: none"> Diverse Austausche mit Terna 	<ul style="list-style-type: none"> Projektierung durch Terna 	Läuft
Untersuchung des wirtschaftlichen Impacts auf Ulten	<ul style="list-style-type: none"> Beauftragung Studie durch Uni Bozen im Sommer 	<ul style="list-style-type: none"> Abschluss bis Ende Dezember Vorstellung Ergebnisse in der AG Januar 	Läuft
Quellmonitoring	<ul style="list-style-type: none"> 19 Quellen im Quellmonitoring Alle Quellen wurden von Geol. Messner ein erstes Mal erhoben 	<ul style="list-style-type: none"> Weitere Erhebungen folgen Es können weitere Quellen ins Monitoring aufgenommen werden. 	Läuft
Geologisches Erkundungsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> Bohrungen im Zoggler Stausee werden kommende Woche beginnen Beauftragung der geoseismischen Untersuchungen (indirekte Methode) im Bereich der Apparatekammer läuft Vorbereitung der Ausschreibung des zweiten Teils der Bohrungen (hochalpin) läuft 	<ul style="list-style-type: none"> Weitere Bohrungen bei Zusage Grundeigentümer geplant 	Läuft
Flora/Fauna	<ul style="list-style-type: none"> Erhebungen Flora und Fauna abgeschlossen (inkl. Herpetofauna) 	<ul style="list-style-type: none"> Auswertung der Ergebnisse 	Läuft
Fischökologie	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturen in Arzkar Stausee und Zoggler erhoben Erhebungen des Fischbestandes abgeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsetzung der Temperaturmessungen im Frühling Auswertung der Ergebnisse 	Läuft
Baustellenlogistik	<ul style="list-style-type: none"> Materialprobe abgeschlossen und Probestonwürfel hergestellt Trasse für Materialseilbahn bestätigt 	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung der Festigkeitsproben Auswertung der Ergebnisse 	Läuft

alperia

2. Update Zoggler

***energie
neu gedacht***

Update Zoggler Staudamm: Aktuelle Stand und Ausblick



Bisher durchgeführte Arbeiten:


- 13. August: Lokalausgleich von Bürgermeistern und Zivilschutz bei Fenster 0 und Bruchstelle
- Ende September wurde die Reparatur der Bruchstelle in der Apparetekammer erfolgreich abgeschlossen
- 03. Oktober: Besichtigung der erfolgten Reparatur und der fortschreitenden Arbeiten durch Bürgermeister Schwarz

Aktuelle Arbeiten → Durchführung bereits geplante Instandhaltungsarbeiten:

- Inspektion und Versiegelung der Asphaltbetondichtung an der Wasserseite des Staudamms abgeschlossen Anfang November, es laufen noch kleinere Fertigstellungsarbeiten.
- Aktuell wird die Baustelle für das Relining des Grundablassstollens vorbereitet. Erste GFK-Rohre wurden geliefert, die Arbeiten an Baugrubensicherung und Dichtwand laufen. Die Druckrohrleitung im Krafthaus St. Pankraz wurde temporär abgetrennt, das Wasser wird über Bypass umgeleitet.

Ausblick:

- Abschluss Sanierung Grundablass im Winter 2025/2026
- Frühjahr 2026 Fertigstellung der Verbindung zum neuen Druckschacht des Kraftwerks St. Pankraz
- Mit einsetzender Schneeschmelze Befüllung des Stausees

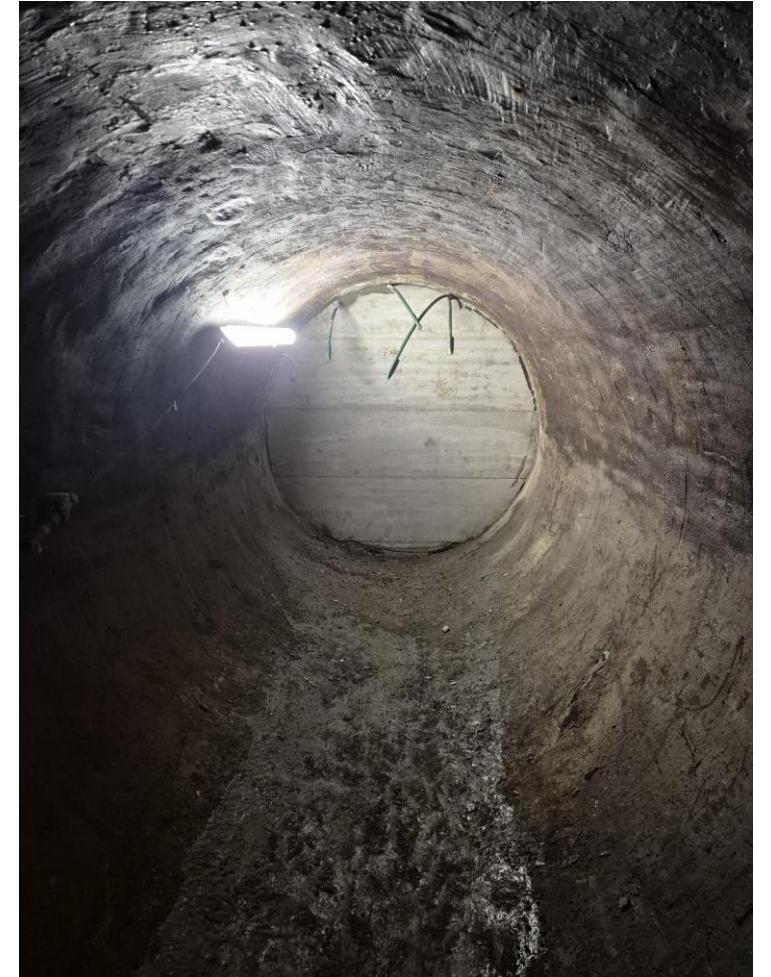

alperia

3. Update Altlasten

***energie
neu gedacht***

Liste Altlasten: Übersicht aktueller Stand



#	Forderung	Beschreibung	Verantwortlich	Status Alperia
1	Höchsterrhütte	Rückgabe Höchsterhütte an den Alpenverein (AVS)	Land	Abgeschlossen
2	Flächenrenaturierung	Ex-Godio Baracken	Land	In Umsetzung
		Eingangsbereich Zugangsstollen des „1er Fenster“	Alperia	Abgeschlossen
		Eingangsbereich Zugangsstollen des „2er Fenster“	Alperia	(offen, Alperia ist bereit)
		Eingangsbereich Zugangsstollen des „3er Fenster“	Alperia	Abgeschlossen
		Sanierungsbedürftige Brücke oberhalb Brücke St. Moritz	Alperia	In Umsetzung
3	Mindestabstand HS-Leitungen	Bestehende HS-Leitungen sind offenbar zu Nahe an Höfen/Wohngebäuden	Terna	(kann unterstützen)
4	Mittelspannungsleitungen als Erdkabel	Realisierung aller bestehenden und neuen Mittelspannungsleitungen als Erdkabel	Edyna	In Umsetzung
5	Entfernung ungenutzter Kabel	Datenleitung Kraftwerk Kuppelwies – Arzkar Stausee und Kabel Kuppelwieser Alm	WindTre	In Umsetzung
6	Mühlen ohne Konzession	Konzessionen der Mühlen offenbar vor 60 Jahren an die STE übergegangen (notwendig für Landesförderungen). Forderung: Rückgabe/kauf der Konzessionen	Land / Besitzer der Mühlen	(kann unterstützen)
7	Rückgabe Waldbesitz sowie Alm- und Wegrechte	Rückgabe der Wald- u. Weiderechte im Besitz der Alperia	Gemeinde Ulten / Alperia	(bei Gemeinde)
8	Kostenbeteiligung Alperia bei Strassen/Wege	Alperia übernimmt nicht die anteilmäßigen Kosten der Hofer-Mais-Strasse	Alperia	In Umsetzung
9	Finanzielle Ausgleichsmaßnahmen bisherige Wasserkraftwerke	Wiedergutmachung für die Vergangenheit, z.B. Beteiligung an der Stromproduktion.	Alperia	Laufend
10	Verteilung Umweltgelder	Gemeinde Ulten sollten frei über ihren eigenen Anteil entscheiden sollen	Land	(Zuständigkeit Land)
11	„Ultenbeauftragter“	Schaffung einer Anlaufstelle in Ulten, wo die betroffenen Bürger ihre Anliegen deponieren, und ihre Rechte einfordern können	Alperia	Abgeschlossen
12	Sicherheit bestehende Anlagen	Maximale Sicherheit für alle bestehenden Anlagen/Bauwerke (Dämme, Stollen, Brücken, Druckleitungen usw.)	Alperia	Laufend
